



Programme d'Appui au Développement Local
et à la Gestion des Ressources Naturelles

برنامج دعم التنمية المحلية وإدارة الموارد الطبيعية

Projet Aménagement Participatif et Gouvernance de Ressources Naturelles de la
Zone Périphérique du Parc National de Zakouma. PAP-GRN

RAPPORT NARRATIF INTERMEDIAIRE DE LA PERIODE DU 14 SEPTEMBRE 2013 AU 13 SEPTEMBRE 2014



Fig1 : Sensibilisation de leaders communautaires sur le thème : Importance du Parc National de Zakouma



COOPERATION TCHAD – UNION EUROPEENNE



Sommaire :

1. Description de l'Action

- 1.1. Nom de bénéficiaire du contrat de subvention
- 1.2. Nom et Prénom de la personne de contact
- 1.3. Nom des partenaires de l'Action
- 1.4. Intitulé de l'Action
- 1.5. Numéro du contrat
- 1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting
- 1.7. Pays ou région(s) cible(s)
- 1.8. Bénéficiaire finaux et/ou groupes cibles
- 1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées

2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l'Action

- 2.1. Résumé de l'Action
- 2.2. Activités et Résultats
- 2.3. Activités planifiées et non réalisées
- 2.4. Evaluation des résultats de l'Actions atteints
- 2.5. Plan d'Action mis à jour

3. Partenaires et autres coopération

4. Visibilité

Annexes

Annexe I : Schéma de structuration mis en place

Annexe II : liste des villages d'intervention

ANNEXE VI

Liste abrégatives

AGR : Activités Génératrices de Revenus

AVIZOP : Association Villageoise pour la Zone Périphérique

CCCD : Cadre de Concertation du Canton Daguela

COGEZ : Comité de Gestion de la Zone Périphérique Aboudéia

CURESS : Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Sahélo-Soudanien

FDC : Forum du Développement Cantonal du Canton Salamat

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PADL-GRN : Programme D'Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles

PAFGA : Programme d'Appui à la Filière Gomme Arabique

PASILD/UE : Programme D'appui Structurant des Initiative Locale de Développement

PDL : Plan de Développement Local

PNZ : Parc National de Zakouma

RFBS : Reserve de Faunes du Bahr Salamat

SDL : Stratégie du Développement Local

UE : Union Européenne

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

ZP : Zone Peripherique,la

1. Description

- 1.1. Nom du bénéficiaire du contrat de subvention: **Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)**
- 1.2. Nom et fonction de la personne de contact: **ANOUSKA PLASMEIJER ET LEONARD USONGO**
- 1.3. Nom des partenaires de l'Action: **Association de Jeunes Pour le Renouveau et le Progrès du Salamat (AJRPS)**
- 1.4. Intitulé de l'Action: **Projet Aménagement Participatif et Gouvernance des Ressources Naturelles de la Zone Périphérique du Parc National de Zakouma**
- 1.5. Numéro du contrat: **FED/2013/323-881**
- 1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting: **Du 14 Septembre 2013 au 13 Septembre 2014**
- 1.7. Pays ou région(s) cible(s): **Région du Salamat, République du Tchad**
- 1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles¹ (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes):

Le groupe cible est constitué de 107 villages regroupé en 9 cantons et d'une dizaine de villages et ferricks situés le long du couloir Nord de migration des éléphants en zone banale. La population concernée est celle des départements d'Aboudéïa, Bahr Azoum, et Bahr Signaka subdivisée en 5 sous-préfectures (Aboudéïa, Abgué, Am Habilé, Djouna (Salamat) et Chinguil (Guera) et 40 000 transhumants séjournant dans la zone périphérique en provenance des régions du Batha, Guera, Sila, Ouaddaï.

Les bénéficiaires finaux du projet sont tous les acteurs impliqués directement d'une manière et d'une autre dans la gestion des ressources naturelles de la ZP et du Parc National de Zakouma. Pour les départements concernés de Bahr Azoum et d'Aboudéïa (Salamat) et Bahr Signaka (Guera), la population s'élève à environ 529 390 habitants dont 51,14% de femmes

- 1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): **République du Tchad**

2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l'Action

¹ Les "groupes cibles" sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l'objectif du projet, et les "bénéficiaires finaux" sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d'un secteur.

ANNEXE VI

Principales activités planifiées et réalisées par résultats :

Au cours de cette première année de mise en œuvre, seize(16) **activités principales** relatives à l'atteinte des trois (03) principaux résultats attendus du projet avaient été planifiées.

Activités du résultat 1 :

- Sur les sept (07) activités principales planifiées, une (01) a été réalisée à 100%;trois d'entre elles (3) autres sont réalisées respectivement à 80%, 75% et 50%, tandis que deux(2) activités n'ont pas été réalisées durant la période de reporting.

Activités du résultat 2 :

- Sur les trois (03) activités principales planifiées, une seule (01) a été réalisée à 100%, une autre à 75% tandis qu'une activité n'a pas pu être réalisée.

Activités du résultat 3 :

- Sur les six (06) activités programmées, quatre (04) étaient réalisées, une accomplie à 100% et trois (03) autres activités accomplies respectivement à 25%,50% et 50% au cours de la période.

2.1. Résumé de l'Action

Veillez fournir un aperçu d'ensemble de la mise en œuvre de l'Action pendant la période de reporting (pas plus d'1/2 page)

L'Action trouve son origine dans le fait que les initiatives antérieures dans la zone prenaient très peu en compte la Zone Périphérique et les activités de développement des populations villageoises. C'est ainsi que le projet vise par des actions spécifiques à agir sur la protection et la valorisation de la biodiversité à travers la concertation locale dans la Réserve de Faune du Bahr Salamat, appelée zone périphérique du Parc National de Zakouma. Il contribue ainsi à appuyer la mise en œuvre des réalisations sociales et économiques, largement orientées vers l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles dans la zone d'intervention du PADL-GRN. L'Action cible trois principaux résultats: 1 - Les structures communautaires de gestion des ressources naturelles s'impliquent dans la gestion du parc; 2- Les communautés riveraines du PNZ améliorent leur connaissance sur le parc et les enjeux de sa gestion durable ; 3- Les communautés riveraines du parc valorisent et exploitent les ressources selon les textes en vigueur.

Au cours de cette période de mise en œuvre, les principales réalisations suivantes ont été effectuées : (i) Recrutement, imprégnation et déploiement de l'équipe sur le terrain, (ii) élaboration d'une stratégie de communication, élaboration d'une stratégie de mise en œuvre, élaboration d'un plan d'action annuel et aux activités de structurations, (iii) etc.

Il faut noter que le Projet a mis du temps pour effectivement démarrer sur le terrain, et ceci pour plusieurs raisons: (i) Le contrat a été signé en fin août 2013; mais ayant des erreurs dans certains parties, des échanges / négociations se sont poursuivies et l'Accord Final a été conclu en fin octobre 2013; (ii) Le processus de recrutement a pris beaucoup de temps, car il fallait respecter toutes les étapes exigibles et rechercher les personnes compétentes qui maîtrisent parfaitement le site pour éviter une perte de temps dans l'imprégnation et la connaissance du site; (iii) Le processus d'acquisition du matériel roulant qui a pris aussi beaucoup de temps, le souci de l'UICN étant de s'assurer que l'ensemble des procédures d'acquisition est respecté.

Veillez fournir un aperçu d'ensemble de la mise en œuvre de l'Action pendant la période de reporting (pas plus d'1/2 page).

2.2. Activités et résultats

Veillez énumérer toutes les activités du contrat exécuté pendant la période de reporting conformément à l'annexe 1.

Résultat 1 : les structures communautaires de gestion de RN s'impliquent dans la gestion du Parc.

R1 A1 : Préparation et coordination de l'action: start up

Avant le démarrage des activités du projet, une procédure d'acquisition de matériels et équipement a été mis en place selon la procédure FED. . A cet effet on note:

- ☞ Achats de quatre (4) motos YAMAHA AG 100
- ☞ Achats de mobiliers

ANNEXE VI

- ☞ Matériels informatiques
- ☞ Achat d'un véhicule Toyota HARD TOP

En outre un avis de recrutement du personnel a été ouvert, les Termes de Référence pour chaque poste ont été publiés dans le site web de l'UICN, ainsi que dans les journaux du Tchad. Aux termes de ce processus de recrutement, le personnel suivant a été recruté:

- Le Coordonnateur du Projet
- L'Assistant au Projet en Charge de Gestion Durable de Ressources Naturelles
- L'Assistant du projet en charge de formation et sensibilisation
- L'Assistant Administratif et Financier
- Les Animateurs
- Les Gardiens et le chauffeur

Après des séances d'imprégnation sur les procédures de l'UICN et de l'Union Européenne à Yaoundé et à Ndjamena, l'équipe opérationnelle a pris fonction effectivement en début d'année et est basée à Amtiman.

Activité A1: Mettre en place un comité de pilotage

Dans le souci d'une meilleure implication des différents acteurs dans le processus de mise en œuvre du projet, un mécanisme de suivi des actions a été mis en place par arrêté du Gouverneur de la Région du Salamat sous le N°038/PR/PM/MATSP/SE/RSA/SG/CRA/2014. Ce comité est composé de l'OCR Intermon Oxfam, les services déconcentrés de l'état et le partenaire AJRPS.

Le Comité de pilotage a pour mandat d'apporter toutes les orientations stratégiques au projet et à sa mise en œuvre, ainsi que la validation des plans d'actions et budgets du projet. Il assure l'appui technique et politique nécessaires à la bonne exécution du projet. Il se réunit tous les six (06) mois ou en session extraordinaire. Le Comité de pilotage composé de quinze membres (15) membres peut organiser des missions de suivi de proximité.

Après la mise en place de ce Comité de Pilotage, la première réunion s'est effectivement tenue le 19 juin 2014 à Amtiman. Les objectifs de cette réunion ont été :

- Présentation et échanges sur le plan d'action annuel
- Présentation des réalisations semestrielles du projet
- Présentation de document de stratégie de communication

Résultats attendus:

- Les participants sont imprégnés sur le projet et son état d'avancement six (6) mois après le démarrage.
- Le plan d'action annuel du projet est validé
- Les observations, les commentaires et les propositions des participants sont recueillis aux fins d'améliorer le contenu du document sur la stratégie de communication.



Image 1 :
Première
réunion du
Comité de
pilotage sur
l'état
d'avancement
semestriel des
activités PAP-
GNR

Activité A1 : Elaborer une stratégie de communication

Pour rendre visibles les actions du projet, une stratégie de communication a été élaborée au mois d'avril. Cette stratégie, qui a été élaborée suivant une approche participative a pour objectif de

ANNEXE VI

contribuer à la création d'un environnement favorable à la compréhension et à la mise en œuvre du Projet PAP-GNR.

Il faut noter que ce document de stratégie a été restitué au cours d'un atelier qui a regroupé les principaux acteurs et partenaires de mise en œuvre parmi lesquels les représentants de l'administration publique, de la société civile, des organisations de producteurs, les opérateurs économiques, les journalistes, les services déconcentrés de l'état et les partenaires. La version finale a été présentée et adoptée à la première réunion du Comité de Pilotage. Ce document présente les objectifs, les axes stratégiques et le programme d'action du processus de communication du projet. Il décrit également la stratégie de mise en œuvre, le cadre logique et le budget estimatif.

Activité A1 : Elaborer une stratégie de mise en œuvre du projet

Le document de stratégie fait suite à des séances de travail avec l'équipe du projet, les acteurs et les partenaires. La finalité de ce document est de permettre aux personnels, acteurs et partenaires d'avoir une compréhension commune du contenu du document du projet (contexte, objectif, cadre logique, etc...). C'est un document qui sert de support pour la mise en œuvre opérationnelle des activités sur le terrain. Il s'inscrit dans un processus dynamique. Outre le contexte, il s'articule autour des éléments clés suivants : Contexte et justification, Objectifs et Résultats attendus, cibles et activités du projet, etc. L'esprit qui a guidé ce document est d'avoir une meilleure idée de ce qu'on va faire (la pertinence de l'activité retenue) et comment on va le faire (la méthodologie à mettre en œuvre pour la réussite, les moyens humains c'est-à-dire l'équipe du projet, services déconcentrés de l'Etat, leaders communautaires etc., matériels/logistiques, financiers, etc.) et surtout la faisabilité de toutes les actions. En effet, Une bonne stratégie de mise en œuvre constitue donc la lanterne d'une initiative. Dans ce sens, elle va stimuler la capitalisation des actions et des leçons apprises. Ces leçons pourront faire l'objet d'une documentation pour aider les autres acteurs agissant dans le même contexte.

Activité A1.1 : Organiser des ateliers de lancement des activités du projet.

Dès l'installation de l'équipe du projet à Amtiman début janvier 2014, des contacts ont été établis avec les différentes autorités pour l'organisation de l'atelier de lancement officiel du projet. Le document projet et le plan d'action ont été transmis à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Région du Salamat; ceci pour permettre aux autorités de prendre connaissance des activités du projet et aussi de préparer l'atelier de lancement officiel des activités.

Le lancement officiel a eu lieu le 10 février 2014 dans la salle de conférence du Centre de Lecture et d'Animation culturelle d'Amtiman sous la Présidence du Gouverneur de la Région du Salamat. Les travaux de lancement ont été marqués par:

- ✓ Le mot de la représentante de l'UICN
- ✓ L'intervention du coordonnateur du projet
- ✓ L'exposé des principaux points du document du projet suivi de débats
- ✓ L'intervention de l'Expert N°1 OCR, Représentant la coordinatrice du PADL-GRN
- ✓ Le discours de lancement officiel des activités du projet par le Gouverneur de la Région du Salamat

Les différentes communications effectuées lors de l'atelier ont été interprétées en arabe ; ceci dans le souci d'un large partage des informations.

Une tournée de lancement du projet a été organisée du 1^{er} au 10 Mars 2014 dans les différentes sous-préfectures de la zone d'intervention. L'objectif de cette tournée était de:

- ☞ Expliquer aux autorités administratives et politiques, les services déconcentrés de l'Etat, les différentes activités que comptent réaliser le projet dans la zone d'intervention et la démarche/approche du projet ;
- ☞ Informer et sensibiliser les participants sur l'importance du Parc National de Zakouma, sur les enjeux de la gestion et de la conservation durable de ressources naturelles de la zone périphérique.
- ☞ Assurer une meilleure compréhension, une adhésion et une appropriation du projet ;

Au total cinq (5) ateliers de lancement ont été organisés : 1254 personnes ont été informées et sensibilisées au niveau régional et sous préfectoral dont quatre cent soixante-treize (473) femmes et quatre cent soixante-seize (476) transhumants, six cent cinq (605) sédentaires.

ANNEXE VI

Les activités de lancement du projet avaient permis aux participants d'avoir une meilleure connaissance des objectifs, activités et approches d'intervention aux fins de susciter leur adhésion et implication dans le processus de mise en œuvre du projet.



Image 2 :
Atelier de
lancement dans
la sous-
préfecture
d'Abgué

Activité A1.2. Appuyer la structuration des populations sédentaires et transhumantes de la zone périphérique situées sur un rayon de 30 km des limites du PNZ

L'appui à la structuration des populations a consisté en la capitalisation des activités de structuration menées par les projets antérieurs (ONG Islamic Relief Worldwide dans le canton Salamat et ACRA dans la zone d'Aboudéia) Leurs intervention avaient abouti respectivement à l'élaboration de Plan de Développement Local et Stratégie de Développement Local sur financement de l'Union Européenne 9eme FED/Programme PASILD. Le PAP – GRN s'est inspiré de cet important travail pour redynamiser les structures existantes en s'appuyant sur les leaders identifiés.

La redynamisation de ces structures a été rendue possible grâce aux activités de sensibilisation et renforcement de capacités sur les thèmes relatifs à *l'importance du Parc National de Zakouma, la formation sur la vie associative, la gestion comptable et l'appui dans la tenue de rencontre* entre les parties prenantes ayant abouti à la collaboration entre les riverains à travers les AVIZOP et l'Administration du Parc National de Zakouma.

Ces dernières ont la charge de sensibiliser les populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son habitat ,d'informer les riverains sur la réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse au Tchad, d'aider les services compétents de l'Etat à assurer la surveillance dans les couloirs de migrations de la faune en saison des pluies, de veiller au respect de la réglementation en matière de chasse et de protection de la nature, de promouvoir une gestion durable de la faune qui soit profitable aux communautés riveraines, de participer à la gestion durable de la réserve de faune du Bahr Salamat et de participer au développement économique des villages et de la zone périphérique. Au total 24 associations villageoises de la zone périphérique ont été redynamisées sur les 30 AVIZOP prévues soit un taux d'exécution de 80%. La mise en place et le processus de reconnaissance officielle de l'Union faitière sont en cours d'exécution.

Activité A1.3. Organiser 02 voyages d'étude et d'échange d'expériences dans 1 pays d'Afrique de l'Ouest ayant une expérience réussie de gestion participative des Aires protégées

Cette activité bien que planifiée au cours de la première année, a été reconduite en deuxième année

Activité A1.4 Faciliter la négociation, la signature et la mise en œuvre d'un protocole de collaboration entre la Direction de la Faune, le PNZ et les associations villageoises

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le projet s'est fixé pour défi de rapprocher les associations villageoises, les services déconcentrés en charge de l'environnement et les gestionnaires du parc rendu par l'organisation des réunions de concertation entre d'une part l'administration du Parc et les leaders communautaires et d'autre part entre les AVIZOP et l'administration du Parc ayant abouti à l'élaboration d'un protocole de collaboration. Ceci va traduire leur volonté réciproque d'agir

ANNEXE VI

ensemble. L'objectif de ce partenariat est de préciser le cadre global de collaboration entre les différents partenaires, ainsi que leurs engagements et responsabilités. La signature du protocole de collaboration est en cours d'exécution. Au total deux (2) réunions de discussions ont été organisées avec la Direction de la Faune et le PNZ en Mai 2014 et Juin 2014 et 132 personnes y ont pris part dont cinq (5) femmes.



Image : Réunion de concertation entre les leaders communautaire et l'Administration du Parc à Kiéké

Activités A1.5. Organiser des formations sur les différentes tâches des AVIZOP en rapport avec les obligations liées à leur implication dans la gestion du parc (protection de la faune, les ressources halieutiques, les feux de brousse, l'impact agricole dans le PNZ)

Dans le souci de redynamiser les AVIZOP, un état de lieux rapide a été réalisé par l'équipe du projet et a permis d'identifier les besoins des AVIZOP mis en place en termes de renforcement des capacités. Des sessions de formation ont été organisées sur les différentes tâches des AVIZOP en rapport avec leurs obligations liées à leur implication dans la gestion du parc, ceci au cours du processus de mise en place des AVIZOP. Cette redynamisation a permis d'appuyer l'équipe de la lutte anti-braconnage du Parc National de Zakouma dans l'exercice de ses activités en leur fournissant des informations sur les personnes suspectes. Au total 24 AVIZOP ont été redynamisées soit 180 personnes dont 25 femmes.

Activités A1.6. Appuyer la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires du PNZ

Cette activité bien que planifiée en première année, n'a pas été réalisée

Résultat 2 : Les communautés riveraines du PNZ améliorent leur connaissance sur le parc et les enjeux de sa gestion durable

Activité A2.1 : Elaborer un programme d'éducation environnementale en conformité avec les besoins des acteurs

La zone périphérique du Parc National de Zakouma enregistre actuellement une dégradation des écosystèmes qui s'accompagne des pertes des espèces suite aux actions anthropiques. De plus, la prévalence des méthodes traditionnelles dans les systèmes agricoles et d'élevage est à l'origine de la dégradation des ressources naturelles. Face à cette situation, le projet a élaboré un guide d'éducation environnementale axé sur les besoins réels des acteurs en matière d'éducation environnementale afin de susciter non seulement la prise de conscience mais également l'engagement ferme de toutes les couches de la population pour une gestion rationnelle et participative des ressources naturelles et de l'environnement. Ainsi, le guide d'éducation environnementale est un manuel à caractère didactique montrant comment éduquer et sensibiliser un groupe cible par rapport à une thématique donnée. Il définit aussi les outils à utiliser par groupes cibles et les messages pour susciter la prise de conscience, les messages pour vulgariser une technologie donnée. Il a été traduit en arabe locale pour faciliter sa compréhension et servir de supports aux actions d'animations. Ce guide élaboré au cours de diagnostic participatif intègre le document de stratégie Nationale de lutte contre la déforestation.

ANNEXE VI

Activité A2.2. : Assurer des visites du PNZ et de l'écomusée pour les habitants de la ZP (sédentaires et transhumants)

Cette activité bien que programmée en première année n'a pas été réalisée

Activité A2.3 : Appuyer la valorisation touristique du patrimoine culturel de la ZP

Dans le souci d'appuyer la valorisation touristique de la zone périphérique du Parc National de Zakouma, une étude sur la zone a été réalisée du 15 Mai au 12 Juin 2014. Les résultats de l'étude ont fait ressortir non seulement les potentialités mais aussi les contraintes.

En termes de potentialités, on peut citer:

- La colline communément appelée « DJENA » où il existe une source d'eau que visitaient dans le passé les touristes avec l'hélicoptère
- Le site de ALKHOURA qui à la forme humaine (personne assise adossée sur une partie de colline et en dessous, il ya une grotte du nom de « DJOUO ABTORCHE faisant frais comme le paradis)
- Les villages des artisans (AGRAB, TARH et DAGOUR)
- La plaine de GRAA
- Organisation de danses traditionnel à kiéké appelé communément AMDJER
- Amkiefo : Danses traditionnelles (AMDJAR) etc.
- Le rocher d'IBIR et l'organisation de danses traditionnelles
- Le rocher de Bône et les rites traditionnels qui l'entourent

Quant aux contraintes on peut relever:

- ☞ Faible structure d'accueil au niveau de la zone périphérique
- ☞ Enclavement de la zone périphérique,
- ☞ Conflits d'intérêt entre l'administration du parc et les villages périphérique autour des activités de l'écotourisme

En outre les potentialités (sites attractifs) identifiées au cours de diagnostics ont été matérialisées en images pour une meilleure valorisation à l'échelle locale, Nationale et Internationale. Mais les appuis en termes d'organisation et de gestion des ressources touristiques sont en cours d'exécution



Image 2 : Campement de Tinga pour accueil des touristes



Image 3 : Plaine de GRAA

Résultat 3 : Les communautés riveraines du parc valorisent et exploitent les ressources selon les textes en vigueur

Activité A3.1 : Réaliser un diagnostic participatif des potentialités socio-économiques de la ZP et des priorités / besoins en matière de développement local

ANNEXE VI

Une des principales activités de l'action a consisté à la réalisation d'un diagnostic participatif sur les potentialités socioéconomiques de la ZP. Le diagnostic a permis de ressortir les potentialités, les contraintes de développement, les besoins, y compris les besoins en renforcement des capacités mais aussi des solutions dont certaines seront traduites en des micros projets portés par des groupements. Les résultats du diagnostic ont fait l'objet de mini-restitution dans les 27 villages sur la base des informations collectées sur les potentialités socioéconomiques et/les besoins/priorités en termes de développement local.

Ces séries de restitution ont mobilisé 1482 personnes dont trois cent quarante-trois (343) femmes et ont permis de produire trois effets majeurs :

- Une prise de conscience sur les potentialités socioéconomiques de la ZP et les contraintes liées au développement des filières porteuses
- L'appropriation des résultats issus de diagnostic simplifié et de l'information illustrée qu'elles contiennent, traduites en arabe et leur utilisation comme outils performant de sensibilisation des populations sur l'importance de la gestion, valorisation et conservation de ressources naturelles.

Le résultat du diagnostic a fait l'objet des communications avec les autorités administratives, les services déconcentrés et les bénéficiaires. Les conclusions et les contributions des participants étaient utilisés lors des ateliers de restitutions organisés au niveau sous préfectoral.



Image 4 : Atelier de restitution de résultats de diagnostics

Activité A3.2 Organiser des formations thématiques sur la valorisation des ressources naturelles essentielles (Neemier, savonnier, le gommier, etc.)

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

Activité A3.3 : Promouvoir la pratique de l'apiculture et de la pêche durables respectueuses de l'environnement

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

Activité A3.4 : Appuyer les groupements spécialisés en équipements de transformations, matériels, etc.

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

Activité A3.5 : Sensibiliser et informer les populations sur les textes juridiques relatifs à l'environnement

Dans le souci de conscientiser la communauté riveraine, cinq (5) séances de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive de bois, des feux de brousse et des pratiques agropastorales néfastes et sur la surveillance des sites de mise en défens ont été organisées. Ces séances de sensibilisation ont été axées sur les causes de principaux phénomènes de dégradation de l'environnement des ressources naturelles (surpâturage, coupe non régulée du bois, défrichage systématique, feux de brousse etc.). Des séances d'animation ont été appuyées par de supports (extrait de la loi 14/PR/2008 traduit en arabe accessible à tout le monde). Au total 1157 personnes dont 321 transhumants et 124 femmes ont été touchées par ces séances d'animation.

Activité A3.6 : Appuyer l'élaboration des conventions locales autour des mares, gommiers, des parcours et des infrastructures liées à la gestion des Ressources Naturelles

ANNEXE VI

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

Activité A3.7 : Appuyer les communautés riveraines à l'instar des femmes dans les activités génératrices de revenus et compatibles avec les objectifs de conservation

Cette activité n'a pas été réalisée

Activité A3.8 : Promouvoir les techniques de mitigation de dégâts d'animaux notamment l'éléphant aux cultures.

Dans le souci de lutter contre la menace liée à la survie et la conservation de la Nature, un état de lieux sur les conflits animaux sauvage et homme a été réalisé. L'étude a permis d'identifier les techniques de mitigation au niveau communautaire afin de lutter efficacement contre cette menace liée à la survie et la conservation de la Nature dont l'une de principale cause réside dans les conflits hommes et animaux sauvages. Le résultat du rapport d'étude fait ressortir également la stratégie développée par les riverains pour protégées les cultures contre les animaux sauvages. Dans le souci de mieux vulgariser cette stratégie communautaire de protection de champs, le projet envisage d'organiser une visite d'échange d'expérience avec le Parc National de Waza au Cameroun.

Activité A3.9 : Former les artisans locaux à la fabrication des foyers améliorés métalogiques

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

Activité A3.10 : Appuyer la sécurisation des ressources pastorales (zones de pâturages enrichies, pistes à bétail, etc.)

Cette activité n'a pas été planifiée en première année

- 2.3. Veuillez énumérer les activités qui avaient été planifiées et qui n'ont pas pu être mises en œuvre et donner une explication sur les raisons.

Activités Planifiées et non réalisées

Résultat 1 Activité A1.1 : Appuyer la structuration de population sédentaires et transhumants

Le processus de structuration n'a pas été réalisé à 100% à cause de l'enclavement de la zone d'intervention. La mise en place d'une union faitière et la reconnaissance officielle de l'union faitière sont programmée en deuxième année.

Résultat 1 Activité A1.2 : Organiser deux (2) voyages d'étude et d'échange d'expérience dont l'une en Afrique de l'ouest ayant une expérience réussie de gestion participative des Aires protégées et l'autre en Afrique de l'est

Le processus d'identification de leaders communautaire n'a pas été chose facile au vue de difficulté liée à l'enclavement de la zone d'intervention du projet. Cette situation a eu une de répercussion sur l'activité entraînant le report de cette activité en deuxième année.

Résultat 1 Activité A1.5 : Appuyer la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires du parc

Cette activité bien que programmée a été reconduite en deuxième année. Car le processus de structuration mis en place n'a pas été à son terme à cause de l'enclavement de la zone d'intervention. Ce qui n'a pas permis d'organiser la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires. Toutefois des réunions de concertation préparatoire ont été organisées entre les structures faitières représentatives des AVIZOP (Cadre de Concertation du Canton Daguella, le Forum de Développement Cantonal du Canton Salamat et le Comité de Gestion de la Zone Périphérique) en vue de jeter les bases d'une future rencontre.

ANNEXE VI

Résultat 2 Activité A2.2 : Assurer des visites du Parc National de Zakouma et de l'écomusée pour les habitants de la ZP (sédentaires et transhumants)

Cette activité bien que programmée n'a pas été réalisée à cause de difficulté liée à l'inondation du Parc National de Zakouma pendant la saison de pluie. Ce qui justifie son report en deuxième année.

Résultat 3 Activité A3.2 : Organiser des formations thématiques sur la valorisation des ressources naturelles essentielles (Neemier, savonnier, gommier etc.)

C'est au cours de diagnostics participatifs de potentialités socioéconomiques que les besoins en termes de formations ont été identifiés en rapport avec la valorisation de certaines ressources naturelles. Mais la formation a été reprogrammée en deuxième année à cause de l'enclavement de la zone d'intervention lié à la saison de pluie.

Résultat 3 Activité A3.7 : Appuyer les communautés riveraines à l'instar des femmes dans les activités génératrices des revenus et compatibles avec les objectifs de conservation

Dans le souci d'assurer le Développement de la Population de la Zone Périphérique et d'appuyer la préservation des ressources naturelles, le Projet Aménagement Participatif et Gouvernance des Ressources Naturelles de la Zone Périphérique, prévoit de financer des microprojets à vocation sociale, économique et environnementale dans les villages de la zone d'intervention. A cet effet un manuel de procédure d'approbation de microprojet a été élaboré et le processus de financement des AGR est reprogrammé dès qu'un diagnostic organisationnel sera réalisé afin d'évaluer les forces et faiblesses des groupements à financer.

A cet effet, pour une meilleure capitalisation des acquis, le projet prévoit le partage d'expérience avec les villages périphériques du Parc National de Waza et Sena Ora.

Résultat 3 Activité A3.6 : *Appuyer l'élaboration des conventions locales autour des mares, gommerais, des parcours et des infrastructures liées à la gestion des Ressources Naturelles*

Afin de mieux prévenir les conflits intercommunautaires autour de la gestion de ressources naturelles, les usagers seront appuyés pour l'élaboration des conventions locales au cours des rencontres. Le projet a prévu d'appuyer la tenue des rencontres auxquelles seront associées les services techniques décentralisés afin de jeter les bases de réflexion, de concertation, de négociation et de recherche des consensus autour de la gestion durable des ressources naturelles. Cependant cette activité a été reconduite en deuxième année afin de permettre à l'équipe du projet de mieux la préparer.

- 2.4. Comment évaluez-vous les résultats de l'Action atteints jusqu'à présent? Incluez vos observations sur l'exécution et la réalisation des rendements, des apports et de l'impact par rapport aux objectifs spécifique et global et indiquez si l'Action a eu des résultats positifs ou négatifs inattendus (veuillez quantifier lorsque c'est possible et vous référer aux indicateurs du Cadre logique).

Veuillez énumérer les risques potentiels qui peuvent avoir compromis la réalisation de certaines activités et expliquer comment ils ont été traités (veuillez vous référer aux indicateurs du Cadre logique).

La mise en œuvre du projet s'est faite avec l'implication des services techniques de l'état, les autorités administratives, les chefs traditionnels, les partenaires et les communautés riveraines. Par rapport aux objectifs spécifiques, on est en droit de dire que les connaissances de la communauté riveraines se sont considérablement améliorées dans la conservation et gestion du patrimoine écologique de la zone périphérique du Parc National de Zakouma. Car les activités planifiées ont été réalisées à plus de 51%. La redynamisation des structures villageoises dans la gestion, la valorisation et la conservation des ressources naturelles constitue une réponse face à une profonde dégradation des Ressources Naturelles, de la faune et de son habitat dans le Parc National de Zakouma et sa zone périphérique.

ANNEXE VI

La mise en œuvre du projet s'est faite avec l'implication des services techniques de l'état, les autorités administratives, les chefs traditionnels, les partenaires et les communautés riveraines. Par rapport aux objectifs spécifiques, on est en droit de dire que les connaissances de la communauté riveraines se sont considérablement améliorées dans la conservation et gestion du patrimoine écologique de la zone périphérique du Parc National de Zakouma. Car les activités planifiées ont été réalisées à plus de 51%. La redynamisation des structures villageoises dans la gestion, la valorisation et la conservation des ressources naturelles constitue une réponse face à une profonde dégradation des Ressources Naturelles, de la faune et de son habitat dans le Parc National de Zakouma et sa zone périphérique.

La collaboration technique avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la Direction de la Faune, la Direction des Parcs Nationaux ont permis d'obtenir des orientations stratégiques sur la mise en œuvre des activités et de mettre les AVIZOP en contact avec les administrations du Parc. L'implication des autorités dans l'action à travers les rencontres d'échanges et d'information fait renaître la confiance entre les AVIZOP et l'administration. On assiste à une institutionnalisation du dialogue entre les autorités administratives du Parc et les AVIZOP sur la gestion et conservation du patrimoine National qui est le Parc National de Zakouma.

Au cours des rencontres, les principales contraintes et difficultés liées à la mise en œuvre du projet sont identifiées, débattues avec les communautés riveraines, les autorités administratives et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre.

Les différentes interventions réalisées au cours du projet ont permis d'obtenir les résultats probants parmi lesquels:

- *Les connaissances dans la conservation et la valorisation du patrimoine écologique de la zone périphérique du Parc National de Zakouma se sont améliorées de 10%*
- *Les AVIZOP mises en place sont redynamisées*
- *Les pratiques liées à la mauvaise gestion et dégradation de ressources naturelles se sont nettement améliorées*
- *Les campagnes de sensibilisation ont permis une prise de conscience dans la protection du Parc National de Zakouma*

La mise en œuvre du projet ne s'est pas faite sans difficultés. Les difficultés majeures sont d'abord liées au retard accusé dans le démarrage effectif des activités, le retard dans l'acquisition de matériels roulants à cause de la lenteur de la procédure de l'UE et l'enclavement de la zone d'intervention. De même, la complexité de la zone d'intervention et son enclavement en saison de pluies sont des limites au respect des échéances des activités de mise en œuvre.

Si nécessaire, veuillez soumettre un Cadre logique révisé en mettant en exergue les changements.

Veuillez énumérer tous les contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 10.000€ attribués pour la mise en œuvre de l'action pendant la période de reporting, en indiquant pour chacun d'eux le montant, la procédure d'attribution suivie et le nom du contractant;

N°	Description	Valeur en Euro	Valeur en FCFA	Procédure appliquée	Nom du Contractant
1	Achat véhicule	46 490	30 495 466	Procédure négociée concurrentielle	CENTRALE D'ACHAT UNOPS(UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES) UNCITY, MARMORVEJ 51 DK-2100 COPENHAGEN, DENMARK
2	Achat de 4 motos	17 982	11 795 593	Procédure négociée concurrentielle	CAMI TOYOTA

ANNEXE VI

ANNEXE VI

Tableau 1 – Niveau d’atteinte du résultat 1 : 07 activités principales planifiées A0-R1 à A7-R1

Activités par Résultats	Principales activités Prévues	Réalisées	Taux de réalisation par activité et par résultat	Ecart	Commentaires/explications
	Préparation et coordination de l'action: Start up, constitution du Comité de pilotage technique pour le suivi, élaboration d'une stratégie de communication et élaboration d'une stratégie de mise en œuvre.	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Recrutement de personnel ☞ Achats et acquisition des matériels (Achats de 4 motos, 1 véhicule, mobiliers et matériels informatiques) ☞ Location d'un local abritant le bureau ☞ Mise en place d'un comité de pilotage ☞ Réalisation d'une stratégie de communication ☞ Réalisation d'une stratégie de mise en œuvre 	100%	0%	<p>En marge de la préparation et coordination de l'action, le Coordonnateur du projet et l'Assistant Administratif et Financier avaient pris part en décembre 2013 à une formation à Yaoundé sur les procédures de l'Union Européenne et l'UICN. Cela leur a permis d'être mieux outillés et d'être aptes à répondre de manière efficace aux attentes en matière de gestion technique, administrative et financière.</p> <p>En janvier 2014, une réunion d'imprégnation de toute l'équipe a eu lieu à Ndjamena avant la prise de fonction. Cette réunion a permis de se familiariser au contenu du projet, aux procédures de l'UICN et de l'UICN.</p> <p>Une mission d'appui technique a eu également lieu en Juin 2014 par l'équipe de Yaoundé. Les objectifs de la mission étaient d'examiner l'état d'avancement du projet, les contraintes et les perspectives, et apporter des orientations techniques sur les approches développées pour la mise en œuvre,</p>
R1A1.1-	Organiser 5 ateliers de lancement des activités du projet ;	Cinq (5) ateliers de lancement ont été organisés dont : 1 atelier de lancement au niveau Regional(Amtiman)	100%	0%	Les activités de lancement du projet organisées ont permis aux participants d'avoir une meilleure connaissance sur les objectifs du projet, ces activités et son approche de mise en œuvre.

ANNEXE VI

		<p>4 ateliers de lancement au niveau sous préfectoral de la zone d'intervention.</p> <p>Au cours de ces ateliers, 1254 personnes ont été informées et sensibilisées au niveau régional et sous préfectoraux dont quatre cent soixante-treize (473) sont des femmes et quatre cent soixante-seize (476) transhumants et six cent cinq (605) sédentaires y compris les autorités administratives, les autorités traditionnelles et coutumières et les services déconcentrés de l'état.</p>			
R1A1.2 -	<p>Appuyer la structuration des populations sédentaires et transhumantes de la zone périphérique</p>	<p>24 AVIZOP sur les 30 prévues ont été redynamisées au cours de séances d'animations et sensibilisation organisées dans les 30 villages de la zone périphérique. Soit 80% de taux de réalisation</p>	80%	20%	<p>80% des AVIZOP mise en place par le projet ont vu leur capacités renforcés sur le rôle de leur structure et les membres des AVIZOP ont été très actifs dans les activités de sensibiliser des populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son habitat, d'Informers les riverains sur la réglementation de la protection de la nature et de promouvoir une gestion durable de la faune qui soit profitable aux communautés riveraines, de participer à la gestion durable. Les structures faïtières (FDC, COGEZ et CCD) représentative des AVIZOP désigneront à leur tour les membres du futur union faïtière.</p>
R1A.1.3 -	<p>organiser un voyage d'étude et d'échange d'expérience dans un pays d'Afrique de l'ouest ayant une expérience réussie de gestion participative des Aires protégées.</p>	<p>☞ Activité reportée ultérieurement</p>	0%	100%	<p>Le processus d'identification de leaders communautaire n'a pas été chose facile au vue de difficulté liée à l'enclavement de la zone d'intervention du projet. Cette situation a eu une de répercussion sur l'activité entraînant le report de cette activité en deuxième année.</p>

ANNEXE VI

R1A.1.4-	Organiser des formations sur les différentes tâches des AVIZOP en rapport avec les obligations liées à leur implication dans la gestion du parc (protection de la faune, les ressources halieutiques, les feux de brousse, l'impact agricole dans le PNZ)	En marge des activités de restructuration rendue possible grâce aux séances d'animation/sensibilisation, des activités de renforcement de capacités ont été organisée afin de permettre aux AVIZOP d'être outillés en rapport avec leurs obligations	75%	25%	Sur la base des besoins de renforcement de capacités identifiés en rapport avec leurs obligations, les AVIZOP ont vu leurs compétences renforcées. Cette activité de renforcement de capacité a été réalisée pendant la mise en place des AVIZOP. Ce qui a permis de redynamiser 24 AVIZOP sur e thème lié à la vie associative et la gestion simplifiée.
R1A.1.5-	Faciliter la négociation, la signature et la mise en œuvre d'un protocole de collaboration entre la Direction de la Faune, le PNZ et les associations villageoises	2 rencontres de concertation organisée entre le projet, les structures faitières existantes et l'administration du Parc et de la faune. L'objectif est de définir les modalités d'élaboration de protocoles de collaboration. La signature de ce protocole de convention est en cours d'exécution	50%	50%	Dans le souci de rapprocher les associations villageoises, les services déconcentrés en charge de l'environnement et les gestionnaires du parc, de protocole de collaboration a été élaboré au cours de réunions, fixant les engagements et responsabilités de chaque partie prenante. La signature du protocole de collaboration est en cours d'exécution.
R1A1.6-	Appuyer la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires du parc	Activité reprogrammée en deuxième année	0%	100%	Cette activité bien que programmée a été reconduite en deuxième année. Car le processus de structuration mis en place n'a pas été à son terme à cause de l'enclavement de la zone d'intervention. Ce qui n'a permis d'organiser la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires. d'une future rencontre.
Taux global d'atteinte du Résultat 1 et écart à combler			57,86%	42,14 %	

Tableau 2 : Niveau d'atteinte du résultat 2 : sur les trois (3) activités planifiées, 75% des activités sont réalisées

Activités par Résultats	Activités planifiées	Activités Réalisées	Taux de réalisation par activité et par	Ecarts	Commentaires/explication d'ecart
-------------------------	----------------------	---------------------	---	--------	----------------------------------

ANNEXE VI

			résultat		
R2A2.1-	Elaborer un programme d'éducation environnementale en conformité avec les besoins des acteurs	Le guide d'éducation environnementale est un outil didactique. Les thèmes ont été identifiés au cours de diagnostics participatifs axés sur les pratiques réelles de la dégradation des écosystèmes par les communautés riveraines. Ce guide a été appuyé par une boîte à image conçue et matérialisée en image.	100%	0%	Face à la dégradation constante des écosystèmes qui s'accompagne des pertes des espèces suite aux actions anthropiques, le projet a élaboré un guide d'éducation environnementale axé sur les besoins réels des acteurs en matière d'éducation environnementale identifié au cours de diagnostics participatifs afin de susciter non seulement la prise de conscience mais également l'engagement ferme de toutes les couches de la population pour une gestion rationnelle et participative des ressources naturelles et de l'environnement. Sa traduction a été faite en arabe pour une meilleure compréhension.
R2A2.2-	Appuyer la valorisation touristique du patrimoine culturel de la ZP	Cette activité a été réalisée à 75% grâce à la réalisation d'une étude sur les potentialités de la zone périphérique du parc national de Zakouma et la matérialisation de ces potentialités en image. Les résultats de l'étude ont fait ressortir non seulement les potentialités mais aussi les contraintes parmi lesquelles : <ul style="list-style-type: none"> - Faibles structures d'accueil au niveau de la zone périphérique - Enclavement de la zone périphérique - Conflits d'intérêt entre l'administration du parc et les villages périphériques autour des activités de l'écotourisme 	75%	25%	Dans le souci de valoriser l'écotourisme, des potentialités (sites attractifs) ont été identifiées au cours de diagnostics. Ces potentialités ont été matérialisées en images pour une meilleure valorisation de ces ressources. Cependant le renforcement des capacités locales en termes d'organisation et de gestion des ressources touristiques sont en cours d'exécution.
R2A2.3-	Assurer des visites du Parc National de Zakouma et de l'écomusée pour les	Activité reprogrammée ultérieurement	0%	100%	

ANNEXE VI

	habitants de la ZP (sédentaires et transhumants)				
Taux global d'atteinte du Résultat 2 et écart à combler			58,34%	41,66%	

Tableau 3 : Niveau d'atteinte du résultat 3 : sur les six (6) activités principales planifiées, une seule activité a été réalisée à 100%

Activités par Résultats	Activités Prévues	Réalisées	Taux de réalisation par activité et par résultat	Ecarts	Commentaires et explication d'écart
R3A3.1-	Réaliser un diagnostic participatif des potentialités socio-économiques de la ZP et des priorités / besoins en matière de développement local	<p>Le diagnostic participatif a permis de ressortir les potentialités et les besoins et les contraintes.les résultats ont fait l'objet de mini-restitution dans les 27 villages et ont mobilisé 1482 personnes dont cent treize (343) femmes et ont permis de produire trois effets majeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une prise de conscience sur les potentialités socioéconomiques de la ZP et les contraintes liées au développement des filières porteuses ▪ L'appropriation des résultats issus de diagnostic simplifié et de l'information illustrée qu'elles contiennent, traduites en arabe par les animateurs et leur utilisation comme outils performant de sensibilisation des populations sur l'importance de la gestion, valorisation et conservation de ressources naturelles. 	100%	0%	Une des principales activités préparatoires de l'action a consisté à la réalisation d'un diagnostic participatif sur les potentialités socioéconomiques de la ZP. Ces diagnostics ont permis de ressortir les potentialités, les contraintes de développement, les besoins, y compris les besoins en renforcement des capacités mais aussi des solutions dont certaines seront traduites en des micros projets portés par des groupements.
	Organiser des formations thématiques sur la valorisation des ressources naturelles essentielles (Neemier, savonnier, gommier etc.)	Cette activité a été réalisée à 25%.Car les besoins en termes de formations ont été identifié au cours de diagnostics participatifs. Un planning de formation a été élaboré Mais la formation a été reprogrammée en deuxième.	25%	75%	C'est au cours de diagnostics participatifs de potentialités socioéconomiques que les besoins en termes de formations ont été identifiés en rapports avec la valorisation de certaines ressources naturelles. Mais la formation a été reprogrammée en deuxième année à cause de l'enclavement de la zone

ANNEXE VI

					d'intervention lié à la saison de pluie.
R3A3.5-	Sensibiliser et informer les populations sur les textes juridiques relatifs à l'environnement	5 séances de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive de bois, des feux de brousse et des pratiques agropastorales néfastes et sur la surveillance des sites de mise en défens ont été organisées dans les 31 villages périphériques. Ces séances de sensibilisation ont été axées sur les causes de principaux phénomènes de dégradation de l'environnement des ressources naturelles (surpâturage, coupe non régulée du bois, défrichage systématique, feux de brousse etc.). Ces séances d'animation ont été appuyées par de supports (extrait de la loi 14/PR/2008 traduit en arabe accessible à tout le monde). Au total 1157 personnes dont 321 transhumants et 124 femmes ont été touchées par ces séances d'animation.	50%	50%	Dans le souci de conscientiser la communauté riveraine sur les méfaits de la coupe abusive de bois, des feux de brousse et des pratiques agropastorales néfastes et sur la surveillance des sites de mise en défens, de séances de sensibilisation ont été organisées. Ces séances d'animation ont été appuyées par de supports (extrait de la loi 14/PR/2008 traduit en arabe accessible à tout le monde).
A3.6-R3	Appuyer l'élaboration des conventions locales autour des mares, gommerais, des parcours et des infrastructures liées à la gestion des Ressources Naturelles.	Activité reportée ultérieurement	0%	100%	Afin de mieux prévenir les conflits intercommunautaires autour de la gestion de ressources naturelles, les usagers seront appuyés pour l'élaboration des conventions locales au cours des rencontres. Le projet a prévu d'appuyer la tenue des rencontres auxquelles seront associées les services techniques décentralisés afin de jeter les bases de réflexion, de concertation, de négociation et de recherche des consensus autour de la gestion durable des ressources naturelles. Cependant cette activité a été reconduite en deuxième année afin de permettre à l'équipe du projet de mieux la préparer

ANNEXE VI

<p>A3.7-R3</p>	<p>Appuyer les communautés riveraines à l'instar des femmes dans les activités génératrices des revenus et compatibles avec les objectifs de conservation</p>	<p><i>Activité reportée en deuxième année</i></p>	<p>0%</p>	<p>100%</p> <p>Dans le souci d'assurer le Développement de la Population de la Zone Périphérique et d'appuyer la préservation des ressources naturelles, le Projet Aménagement Participatif et Gouvernance des Ressources Naturelles de la Zone Périphérique, prévoit de financer des microprojets à vocation sociale, économique et environnementale dans les villages de la zone d'intervention. A cet effet un manuel de procédure d'approbation de microprojet a été élaboré et le processus de financement des AGR est reprogrammé en deuxième année dès qu'un diagnostic organisationnel sera réalisé afin d'évaluer les forces et faiblesses des groupements à financer.</p>
<p>A3.8-R3</p>	<p>Promouvoir les techniques de mitigation de dégâts d'animaux notamment l'éléphant aux cultures</p>	<p>Une étude a été réalisée sur les conflits animaux sauvages et hommes. L'étude a permis d'identifier les techniques de mitigation au niveau communautaire afin de lutter efficacement contre cette menace liée à la survie et la conservation de la Nature dont l'une de principale cause réside dans les conflits hommes et animaux sauvages. Le résultat du rapport d'étude fait ressortir également la stratégie développée au niveau communautaire pour protégées les cultures contre les animaux sauvages.</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p> <p>Dans le souci de lutter contre la menace liée à la survie et la conservation de la Nature, un état de lieux sur les conflits animaux sauvage et homme a été réalisé. L'étude a permis d'identifier les techniques de mitigation au niveau communautaire afin de lutter efficacement contre cette menace liée à la survie et la conservation de la Nature dont l'une de principale cause réside dans les conflits hommes et animaux sauvages. Le résultat du rapport d'étude fait ressortir également la stratégie développée par les riverains pour protégées les cultures contre les animaux sauvages.</p>

ANNEXE VI

Taux global d'atteinte du Résultat 3 et écart à combler			37,50%	62,50%	

ANNEXE VI

2.5. Veuillez fournir un plan d'action mis à jour² du **13 Septembre 2014 au 31 Août 2015**

Année1													
Activité	Semestre 1						Semestre 2						Responsable
	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	Organisme responsable de la mise en œuvre
Résultat 1: Les structures communautaires de gestion des ressources naturelles s'impliquent dans la gestion du parc;													
Préparation :													UICN/AJRPS
Elaborer les TDR													UICN/AJRPS
Identifier le lieu de la tenue de l'Assemblée de mise en place d'une union faitière													UICN/AJRPS
Elaboration de texte statutaire													UICN/AJRPS
Exécution													UICN/AJRPS
Mise en place de l'Union Faitière													UICN/AJRPS
Appuyer l'union faitière dans la négociation													UICN/AJRPS
RI A1.2. Appuyer la structuration des populations sédentaires et transhumantes de la zone périphérique													UICN/AJRPS
Préparation													UICN/AJRPS
Elaborer les TDR													UICN/AJRPS
Identifier le pays													UICN/AJRPS
Organisation matérielle et logistique du voyage													UICN/AJRPS
Exécution													UICN/AJRPS
Assurer les voyages													UICN/AJRPS
Assurer la restitution de leçons apprises													UICN/AJRPS
Assurer le suivi et évaluation													UICN/AJRPS
A1.3. Organiser deux voyages d'étude et d'échange d'expérience dans un pays d'Afrique de l'ouest et en Afrique de l'est ayant une expérience réussie de gestion participative des Aires protégées.													UICN/AJRPS
Préparation													UICN/AJRPS
Elaboration de TDR													UICN/AJRPS
Elaboration de planning de formation													UICN/AJRPS
Conception des modules													UICN/AJRPS
Exécution													UICN/AJRPS
Assurer la formation													UICN/AJRPS
Assurer le suivi et évaluation de la formation													UICN/AJRPS

² Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.

ANNEXE VI

RI A1.4.Organiser des formations sur les différentes tâches des AVIZOP en rapport avec les obligations liées à leur implication dans la gestion du parc (protection de la faune, les ressources halieutiques, les feux de brousse, l'impact agricole dans le PNZ)																				UICN/AJRPS	
Préparation																					UICN/AJRPS
Elaborer les TDR																					UICN/AJRPS
Elaborer les protocoles de collaboration																					UICN/AJRPS
Exécution																					UICN/AJRPS
Appuyer la négociation et la signature de collaboration																					UICN/AJRPS
Assurer le suivi de la mise en œuvre de cette collaboration																					UICN/AJRPS
RI A.1.5.Faciliter la négociation, la signature et la mise en œuvre d'un protocole de collaboration entre la Direction de la Faune, le PNZ et les associations villageoises																					UICN/AJRPS
Préparation																					UICN/AJRPS
Elaborer les TDR																					UICN/AJRPS
Organisation materielle et logistique																					UICN/AJRPS
Exécution																					UICN/AJRPS
Assurer la tenue de rencontre																					UICN/AJRPS
Assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des engagements																					UICN/AJRPS
A1.6. Appuyer la tenue des rencontres périodiques entre les leaders des associations et les gestionnaires du parc																					UICN/AJRPS
Résultat 2 : Les communautés riveraines du PNZ améliorent leur connaissance sur le parc et les enjeux de sa gestion durable																					
Préparation																					UICN/AJRPS
Elaboration des TDR																					UICN/AJRPS
Préparation materielle et logistique																					UICN/AJRPS
Exécution																					UICN/AJRPS
Organiser les visites																					UICN/AJRPS
Projection de films sur le Parc National de Zakouma																					UICN/AJRPS
Projection de film animalier																					UICN/AJRPS
R2 A.2.2. Assurer des visites du Parc National de Zakouma et de l'écomusée pour les habitants de la ZP (sédentaires et transhumants)																					UICN/AJRPS
Préparation																					UICN/AJRPS
Préparer les outils de sensibilisation																					UICN/AJRPS
Organisation materielle et																					UICN/AJRPS

ANNEXE VI

logistique														
Exécution														UICN/AJRPS
Organiser la formation														UICN/AJRPS
Appuyer la mise en œuvre de circuits ecotouristiques														UICN/AJRPS
Assurer le suivi et évaluation														UICN/AJRPS
R2 A.2.3 Appuyer la valorisation touristique du patrimoine culturel de la ZP														UICN/AJRPS
Résultat 3 : Les communautés riveraines du parc valorisent et exploitent les ressources selon les textes en vigueur														
Préparation														UICN/AJRPS
Élaborer les TDR														UICN/AJRPS
Elaborer un planning de formation														UICN/AJRPS
Préparer les modules de formation														UICN/AJRPS
Organisation matérielle et logistique														UICN/AJRPS
Exécution														UICN/AJRPS
Assurer la formation														UICN/AJRPS
Assurer le suivi de la mise en œuvre des acquis de la formation														UICN/AJRPS
R3 A3.2.Organiser des formations thématiques sur la valorisation des ressources naturelles essentielles (Neemier, savonnier, gommier etc.)														UICN/AJRPS
Préparation														UICN/AJRPS
Préparation de fiche d'évaluation et de suivi														UICN/AJRPS
Définir les groupes cibles cible														UICN/AJRPS
Exécution														UICN/AJRPS
Organiser les activités de sensibilisation														UICN/AJRPS
Assurer le suivi des activités de sensibilisation														UICN/AJRPS
R3 A3.5 Sensibiliser et informer les populations sur les textes juridiques relatifs à l'environnement														UICN/AJRPS
Préparation														UICN/AJRPS
Identifier les groupes cibles														UICN/AJRPS
Elaborer les conventions locales														UICN/AJRPS
Exécution														UICN/AJRPS
Organiser les rencontres														UICN/AJRPS
Assurer la signature de la convention locale														UICN/AJRPS
Assurer le suivi de la convention														UICN/AJRPS
R3 A.3.6.Appuyer l'élaboration des conventions locales autour des mares, gommerais, des parcours et des infrastructures liées à la gestion des Ressources Naturelles.														UICN/AJRPS
Préparation														UICN/AJRPS

ANNEXE VI

et le Progrès du Salamat et d'autre part au paiement des animateurs et deux gardiens mis à la disposition du projet.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique de l'UICN à vouloir accroître la compétence du partenaire dans la gestion de ressource et contribue de ce fait au transfert de compétence technique

3.2. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités étatiques dans les pays de l'Action? Comment ces relations ont-elles affecté l'Action?

Les relations entre l'UICN et les autorités étatiques sont globalement satisfaisantes. C'est grâce aux facilités offertes par l'administration qu'on a pu atteindre les résultats ci-dessus malgré les contraintes relevées en cette première année. Nous envisageons d'ailleurs une campagne stratégique de partage des résultats et leçons apprises de nos activités dans le cadre de ce projet et d'autres initiatives en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement dans les prochaines semaines.

3.3. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation impliquée dans la mise en oeuvre de l'Action:

- Associé(s) (si existant)
- Sous-contractant(s) (si existant)
- Bénéficiaires finaux et groupes cibles
- Autres tiers impliqués (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).

Rien à signaler

3.4. Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous auriez développés avec d'autres actions.

Un cadre de partenariats a été mis en place à travers la réunion du CSO et la réunion de concertation Régionale:

- ☞ African Park Network : le partenariat avec APN s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions transversales. Des initiatives conjointes ont été discutées au cours des rencontres et qui se sont traduites par la définition conjointe de plan d'action et le développement de synergie.
- ☞ Village Millénaire : Le Projet village Millénaire intègre tous les objectifs du Millénaire pour le Développement (8OMD) dont la protection de l'environnement fait partie intégrante de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Dans le souci de promouvoir une synergie d'action commune, des rencontres de partage d'information et d'harmonisation des approches ont été discutées afin de définir dans le futur une synergie commune dans la gestion et protection de ressources naturelles.
- ☞ ACRA : Cooperazione Rurale in Africa e America Latina(ACRA) est une ONG qui intervient dans la zone périphérique d'Aboudéïa à travers son projet de renforcement des capacités de la population des cantons de la Zone Périphérique du Parc National Zakouma coté Aboudeïa dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles. Dans le souci d'atteindre les mêmes objectifs, des actions de synergie ont été définies avec UICN qui se sont traduits par le partage d'information et d'approche de mise en œuvre et les perspectives d'élaboration d'un document de capitalisation pour les deux projets sur les thèmes liés à la valorisation et conservation de ressources naturelles
- ☞ PAPAT : Projet d'Appui à la Production Agricole au Tchad intervient dans la région du Salamat et plus particulièrement dans la zone périphérique du Parc National de Zakouma dont l'objectif est d'appuyer les communautés rurales et les organisations de producteurs à augmenter la production des espèces végétales et animales ciblées dans les zones du projet, tout en développant des pratiques de Gestion Durable des Terres et des Eaux dans les écosystèmes vulnérables au climat. Pour mieux promouvoir une agriculture durable sur la base du respect de l'environnement, des rencontres d'échange et de partage d'expérience ont été organisées

ANNEXE VI

avec le projet PAPAT pour une meilleure synergie d'action. Sur les thèmes liés au défrichage agricoles

- ☞ OCR INTERMON OXFAM : En tant qu'OCR, il intervient dans l'accompagnement des actions de tous les projets PADL/GRN à travers le renforcement, le suivi quotidien des actions et rend compte de l'état d'avancement des activités au PADL - GRN.

- 3.5. Si votre organisation a reçu précédemment d'autres subventions UE ayant comme objectif d'appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette Action a-t-elle pu renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Enumérez toutes les subventions UE précédentes pertinentes).

4. Visibilité

Comment la visibilité de la contribution de l'UE est-elle assurée dans l'Action?

Au cours de la période de reporting, la visibilité de l'Union Européenne/PADL-GRN a été assurée comme suit :

- Implantation de quinze **(15) plaques** dans les villages et sur les principaux axes de la ville d'Am Timan matérialisant le partenariat entre UICN et l'Union Européenne/PADL - GRN ;
- Décoration aux logos de l'Union Européenne et UICN du véhicule financé par le budget de la subvention;
- Confection et port de **soixante (60) tee-shirts** lors des activités sur lesquels sont décrits le projet et le partenariat entre UICN et l'Union Européenne/PADLGRN ;

Affichage de **banderoles** exprimant le partenariat entre UICN et l'Union Européenne lors de l'atelier de lancement des activités du projet et autres séances d'animation;



Image 5 : Visibilité sur la banderole au cours d'une séance d'animation

- Affichage des autocollants sur les appareils et mobiliers du bureau
- Distribution de dépliants sur le projet aux drapeaux de l'Union Européenne et du logo d'UICN lors de l'atelier de lancement des activités du projet.
- Médiatisation des cérémonies de lancement des activités du projet, faisant apparaître les couleurs de l'Union Européenne/PADL - GRN et la part de subvention accordée à l'Action ;
- Information continue des groupes cibles et des bénéficiaires finaux sur la part de subvention accordée par l'Union Européenne/PADL/GRN pour la réalisation de l'Action.
- Production des notes d'information sur le projet avec leur diffusion dans tous les réseaux de l'UICN avec les logos de l'UE.

Il faut aussi noter que les résultats de projet seront exposés lors du Congrès Mondial des Parcs qui se tiendra à Sydney en novembre prochain. Tous les documents porteront le logo de l'UE

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des Actions. Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid ? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.

Nous ne voyons aucune objection.

ANNEXE VI

Nom de la personne de contact pour l'Action: ANOUSKA PLASMEIJER & LEONARD USONGO

Signature:


Localité:

Date à laquelle le rapport était dû: 14 Septembre 2013 au 13 Septembre 2014

Date d'envoi du rapport:

ANNEXE VI

Annexe I : Schéma de structuration mis en place

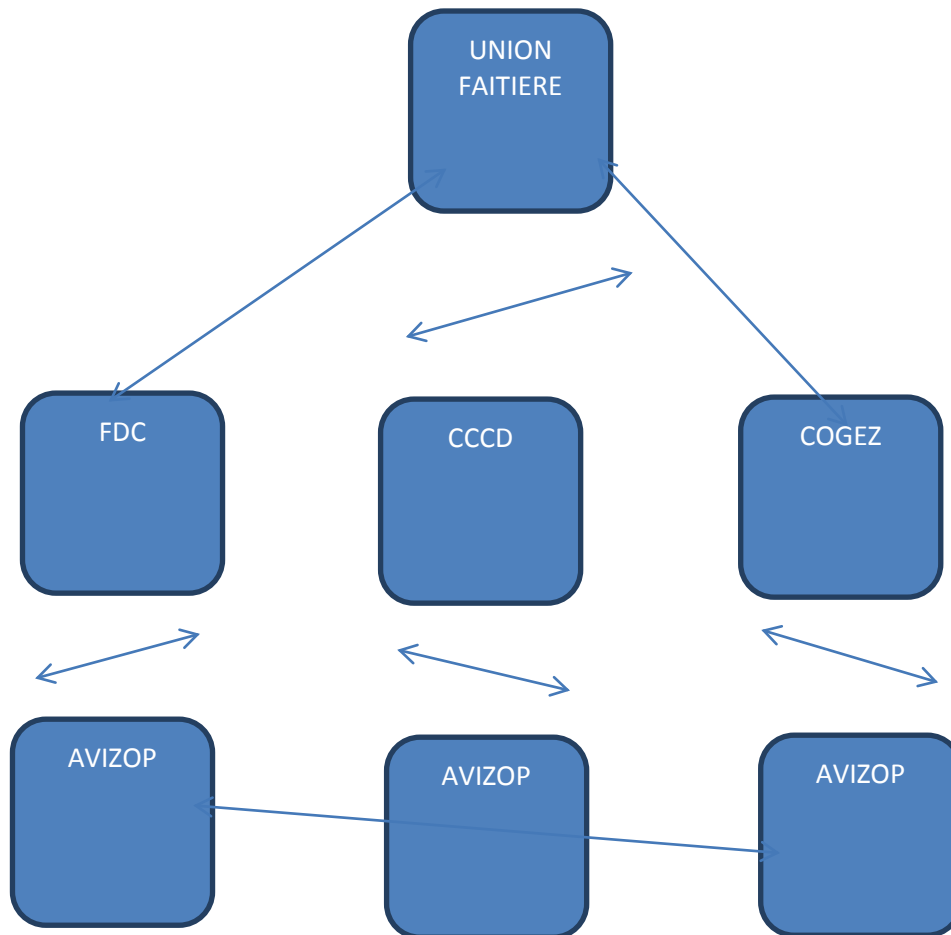

Annexes II : Liste de villages d'intervention :

DÉPARTEMENT	CANTONS	VILLAGES SÉLECTIONNÉS	TOTAL
BARH-AZOOM	Salamat 1	DJOGO,MAGADADA ,AM-KIFO,DELEBAYE,KAYE,KIEKE,TIOLE	7
	Salamat 2	KACH-KACHA,DJARAT ABOUNIMIR,DJARAT ADJIMELATE, DJARAT ALKALL,AMBAR-HADJ,AL-ALAK,AMCHOKA,ANNALA,	9
ABOUDEIA	OULED RACHID, RACHID	ZARZOURA, TIMNOMAK,	2
	AUTOCHTONE, SOUS-PREFECTURE ABOUDEIA	TARH ,BOGAM,TAMARAM,KAROUM KOUMRA,MINADAOU	6
BARH-SIGNAKHA	DAGUELA	IBIR, GOUME, BONE I, BONE II, GARANDA, MIRERAYE, HAGALO	7
